

## NEUES MUSEUM / BERLIN MITTE


### KONSERVIERUNGSMABNAHMEN IN DER APOLLONISCHE

Vor Beginn der Rohbauarbeiten im Bereich des ägyptischen Hofes im Neuen Museum mussten vorgezogene Konservierungsmaßnahmen in der dort befindlichen Apollonische durchgeführt werden. Diese umfassten folgende Arbeiten:

- Reinigung der Malschicht
- Festigung der Malschicht (Ölwachstechnik)
- Niederlegen von Malschichtschollen
- Festigen und Konservieren von Putzhohllagen
- Sichern und Anböschern von Profilkanten



Ansicht der Nischenkallotte nach der Konservierung

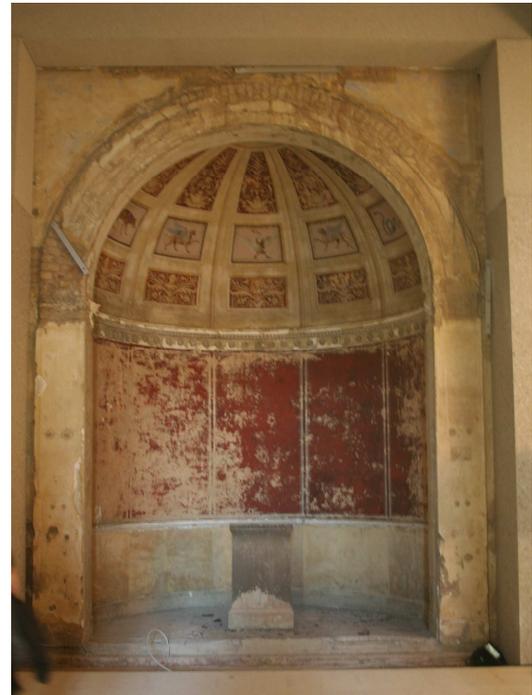


Gesamtansicht der Apollonische nach der Konservierung



Detail zur Maltechnik der Kallottengestaltung



Detailansicht Probestfläche zur Malschichtreinigung

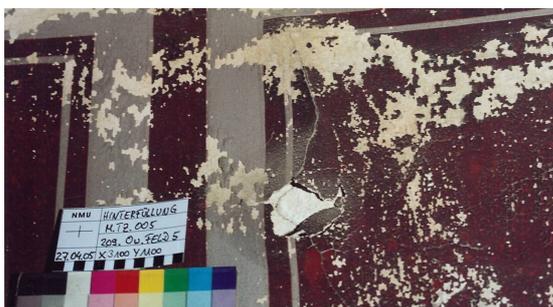

Detailansicht einer Putzhohllage im Vorzustand



Detailansicht einer Putzhohllage nach der Konservierung
